

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2015-2018
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO", EN GUAYMAS, SONORA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-03

SIENDO LAS 9:00 HRS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO", EN GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. DAVID MARTÍN KIAMY FELIX, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LA C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO, SUPERVISOR DE OBRA, EL C. ING. JAIME AGRUEL ROBLES, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL C. ING. MANUEL GONZALEZ ROBLES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y LA C. ELMA LEONOR MIRANDA, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO EDAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING. FRANCISCO JAVIER TORALBAS LUGO.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS OPA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING. FRANCISCO JAVIER TORALBAS LUGO. SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-03, DE FECHA: 23 DE MARZO DEL 2018, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 929,454.64 (SON: NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO. TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DADO EN BOLETÍN OFICIAL NO. 9, SECCIÓN III, TOMO CCI, DE FECHA: 29 DE ENERO DEL 2018, DONDE VIENE PUBLICADO LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-03, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE \$ 929,454.64 (SON: NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.) PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA 637.18 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION, EN L.O.T., 558.71 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 101.62 M3

Elma L. Miranda M.

Francisco Javier Toralbas Lugo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2015-2018
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO", EN GUAYMAS, SONORA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-03

EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C"; 446.03 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.; 637.18 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA; 173.29 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 9.00 PZA SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.; 267.61 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO; 56.00 LOTE TOMA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION; 2.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBault DE 100 MM. 3" DE DIAMETRO COMPLETA; 2.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HID. DE 4"x4" DE DIAMETRO; 8.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC HID. DE 4" DE DIAMETRO; 2.00 PZA CRUZ DE PVC ANGER DE 4" DE DIAMETRO; 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HID. DE 45° X 4" DE DIAMETRO; 2.00 PZA ATRAQUE DE CONCRETO TRAPESOIDAL DE 10X45X30 DE 15 CMS DE ESPESOR; 2.00 PZA CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE 1.10M; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO BRIDADA; 4.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 4" DE DIAMETRO; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE 1.10 M. CON CANAL DE 4"; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO; 16.00 PZA TORNILLO C/TUERCA 5/8" x 3"; 4.00 PZA SUMINISTRO EMPAQUE DE PLOMO DE 101 MM (4") DE DIAMETRO; 815.19 M3 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO; 7,336.71 K-M3 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO; 251.69 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA; 2.00 PZA REDUCCION DE PVC 4"x3" DE DIAMETRO; 29.00 PZA REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO; 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CEMENTADO DE PVC HID. DE 3" DE DIAMETRO; **CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO**; 56.00 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 66.35 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 39.20 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; 56.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA; 15.12 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO 3.00 PZA SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.; 23.52 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO; 8.00 LOTE TOMA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION; 2.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBault DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA; 86.26 M3 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.; 776.34 K-M3 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.; 25.94 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA; 2.00 PZA FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4; **CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO**; 48.00 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 165.55 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 4.01 M3 EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C"; 24.00 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; 48.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA; 3.00 PZA SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.; 7.68 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO; 6.00 LOTE TOMA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION; 13.42 M3 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.; 120.78 K-M3 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.; 48.00 ML ENCOFRADO DE TUBERIA DE 4" PVC HID. A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2; 103.00 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 52.50 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 4.78 M3 EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C"; 65.25 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; 103.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20; 7.20 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 20.87 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO; 3.00 PZA SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.; 8.00 LOTE SUM. Y COLOC.DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE DESCARGA SANITARIAS; 48.63 M3 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.; 436.77 K-M3 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.; 6.00 PZA FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4; 2.00 POZO CONEXION A LA RED EXISTENTE; 22.80 M2 DEMOLICION Y REPOSICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR DE PAVIMENTO EXISTENTE; 98.60 ML ENCOFRADO DE TUBERIA

Elma F. Miranda M.
Cecilia Cuervo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2015-2018
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO", EN GUAYMAS, SONORA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-03

DE 8" PVC SAN. A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2; 1.00 POZO FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 0.80 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 2.00 PZA ATRAQUE DE CONCRETO TRAPESOIDAL DE 10X45X30 DE 15 CMS DE ESPESOR; 2.00 PZA ATRAQUE DE CONCRETO TRAPESOIDAL DE 10X45X30 DE 15 CMS DE ESPESOR; 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC ANGER HID. DE 4" DE DIAMETRO; 53.90 M2 FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"; 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CEMENTADO DE PVC HID. DE 3" DE DIAMETRO.

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	39	278,836.39
ESTIMACION 1 (UNO)	40	363,799.65
ESTIMACION 2 (DOS)	43	154,656.59
ESTIMACION 3 (TRES)	44	105,590.07
ESTIMACION 4 (CUATRO) Y FINIQUITO	45	26,571.93

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACION DE **70 DIAS NATURALES**, INICIANDO EL DIA **06 DE ABRIL DEL 2018** Y CONCLUYENDO EL DIA **14 DE JUNIO DEL 2018**, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 18A12223**, EXPEDIDA POR **FIANZAS DORAMA, S.A.** , POR UN MONTO DE \$ **92,945.46 (SON: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.)**; INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Elma J. Miranda M.

Caral Quich Au.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2015-2018
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO", EN GUAYMAS, SONORA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-03

CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:00 HRS, DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA:



C. ING. FRANCISCO JAVIER TORALBAS LUGO
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO EDAL,, S.A. DE C.V.

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
REPRESENTADO POR:

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C. DAVID MARTÍN KIAMY FELIX

Araceli Amith Alv.

Elma F. Miranda M.

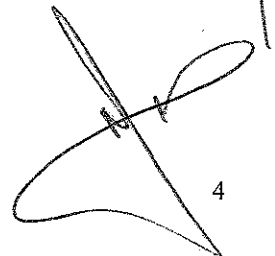

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2015-2018
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

J

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOMA BONITA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y VIII COL. CENTRO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 AVE. III COL. EL RASTRO", EN GUAYMAS, SONORA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-03

SUPERVISOR DE OBRA

Mabel Aniel M.

C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA

J. Agruel Robles
C. ING. JAIME AGRUEL ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M. Gonzalez Robles
C. ING. MANUEL GONZALEZ ROBLES

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M. Andres Valenzuela Flores
C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

Elma L. Miranda M.

C. ELMA LEONOR MIRANDA

[Handwritten signature]
