

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COL. AMPLIACION POPULAR, EN GUAYMAS SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SE-06

SIENDO LAS **12:00 HRS** DEL DIA **22 DE MAYO 2019**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COL. AMPLIACION POPULAR, EN GUAYMAS SONORA. MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C., EL ING. **VICTOR MARIN MARTINEZ**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL ING. **MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES** SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL ING. **SERGIO PAEZ RAMOS**, SUPERVISOR DE OBRA, LA C. **ROSA ISELA ROMERO MACHADO**, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS Y POR LA EMPRESA EL ING. **JOSE A. JUAREZ CAZARES**, REPRESENTADO POR EL MISMO

DECLARACIONES



LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA. **ING. JOSE A. JUAREZ CAZARES**, REPRESENTADO POR EL MISMO, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-19-FISMDF-SE-06**, DE FECHA: **02 DE ABRIL DEL 2019**, POR UN MONTO TOTAL DE \$ **352,204.01** (SON: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 01/100 M.N.**), CON I.V.A. INCLUIDO. TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. DADO EN BOLETINM OFICIAL No. 8, SECCION I, TOMO CCIII, DE FECHA: **28 DE ENERO DE 2019**, DONDE VIENE PUBLICADO LA DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION PARA LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO EN CURSO.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

350.50 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION, 132.00 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE MATERIAL TIPO B, 141.95 M3 EXCAVACION EN ZANJA DE MATERIAL TIPO C, 262.88 M2 PLANTILLA DE ARENA, 350.50 ML INTRODUCCION DE LINEA HIDRAULICA CON TUBERIA PVC 4" DE DIAM. 102.39 M3 RELLENO CON ARENA, 86.03 M3 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, 35.00 LOTES DE TOMAS DOMICILIARIAS, 1.00 PZA. CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS INC. VALVULA DE FOFO 4" DE DIAM. 1.00 LOTE DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

Rosaisela
Romero M



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COL. AMPLIACION POPULAR, EN GUAYMAS SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SE-06

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SE-06, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE: \$ 352,204.01 (SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 01/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	018	\$ 105,661.19
ESTIMACION 1	022	\$ 122,060.00
ESTIMACION 2	025	\$ 124,482.82
	TOTAL	\$ 352,204.01




PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO CONTRACTUAL DE 60 DIAS NATURALES, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DE 2019 Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO: 06 DE JUNIO DE 2019; MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN 44 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA: 08 DE ABRIL DE 2019 Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA: 21 DE MAYO DE 2019, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 19A11117, EXPEDIDA POR AFIANZADORA DORAMA. POR UN MONTO DE \$ 35,220.00 (SON: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE

Rosa Isela
Romero M.



2

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COL. AMPLIACION POPULAR, EN GUAYMAS SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SE-06

SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 13:00 HRS, DEL DIA 22 DE MAYO DE 2019, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.


ENTREGA

EL CONTRATISTA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION:



ING. JOSE A. JUAREZ CAZARES

Rosa Isela
Romero M

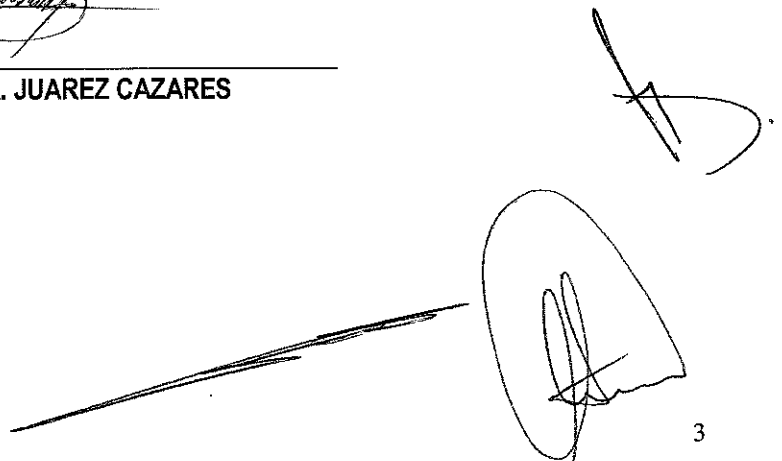

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COL. AMPLIACION POPULAR, EN GUAYMAS SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FIS MDF-SE-06

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA




C. ING. SERGIO M. PAEZ RAMOS

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGÍA



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



C. ING. MANUEL A. VALENZUELA FLORES

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

Rosa Isela
Romero M

C. ROSA ISELA ROMERO MACHADO
