

FLEW  
20CP

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS SONORA."**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-20**  
**CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-20-CAM01**

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS SONORA".


AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EL C. ING. JESUS OSUNA DIAZ, RESIDENTE DE OBRA, EL C. ISAAC MANUEL BOJORQUEZ FELIX, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA C. JULIO CESAR CASTRO OSUNA REPRESENTADO POR EL MISMO, FUNGIENDO TAMBIEN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

**DECLARACIONES**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA C. JULIO CESAR CASTRO OSUNA REPRESENTADO POR EL MISMO, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-20, DE FECHA: 17 DE MAYO DEL 2021, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 812,451.65 (SON: OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO, CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-20-CAM01 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 176,153.05 (SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

Julio Castro:

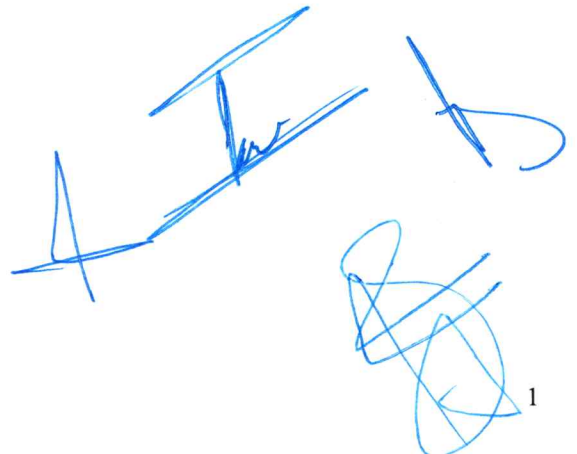

1

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 Administración Municipal 2018-2021  
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
 Dirección de Obras Públicas  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS SONORA."**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-20**  
**CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-20-CAM01**



**LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:**

552.72 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS 15 CMS. DE ESPESOR; 552.72 M2 FORMACION DE BASE POR MEDIOS MECANICOS DE 15 CMS. DE ESPESOR; 552.72 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO TIPO ECI-60 A RAZON DE 1.5 LT/M2; 501.68 M2 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO MR -42 DE 15 CM. DE ESPESOR; 81.95 ML FABRICACION DE GUARNICION TIPO "I" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2; 45.64 ML FABRICACION DE GUARNICION EN COCHERA DE 15 X 40 CMS. DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 ; 68.0 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO RD-41 SERIE METRICA; 63.00 ML TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO; 16.00 PZAS CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" INCLUYE: ABRAZADERA DE 4" X 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN PARA POLIETILENO DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA FE/POL SIST/COMP (IPS) 1/2"; 68.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" SERIE 20; 61.00 ML DESCARGA SANITARIA A BASE DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 6"; 13.00 PZAS CONEXIÓN A ATARJEIA INCLUYE: SILLETA DE 6"X8", CODO DE PVC DE 6".

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-20, CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-20-CAM01 DE PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE CONTRACTUAL DE: \$ 988,604.70 (SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 70/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	92	\$ 243,735.50
ESTIMACION 1 (UNO)	93	\$ 174,932.86
ESTIMACION 2 (DOS)	94	\$ 182,721.55
ESTIMACION 3 (TRES)	97	\$ 167,531.84
ESTIMACION 4 (CUATRO)	98	\$ 33,806.10
ESTIMACION 5 (CINCO) Y FINIQUITO	99	\$ 9,723.79
ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL	102	\$ 176,153.05
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 988,604.70</b>

J. Castro:

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS SONORA."  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-20  
CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-20-CAM01

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:**

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN **PERIODO CONTRACTUAL** DE 70 DIAS NATURALES, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO: **20 DE MAYO DEL 2021** Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO: **28 DE JULIO DEL 2021**; MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN **87 DIAS NATURALES**, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA: **20 DE MAYO DEL 2021** Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA: **14 DE AGOSTO DEL 2021**, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**


FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO **3549-04871-7**, EXPEDIDA POR **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE \$ **98,860.48 (SON: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N.)** CON I.V.A. INCLUIDO DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

Julio Castro:



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS SONORA."  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-20  
CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-20-CAM01

---

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 13:00 HRS, DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

**ENTREGA**

**EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION:**

*Julio Castro:*

---

**C. JULIO CESAR CASTRO OSUNA  
REPRESENTANTE LEGAL**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS SONORA."  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FIS MDF-SI-20  
CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FIS MDF-SI-20-CAM01

---

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

C. ING. JESUS OSUNA DIAZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

C. ISAAC MANUEL BOJORQUEZ FELIX

*Julio Castro*
