



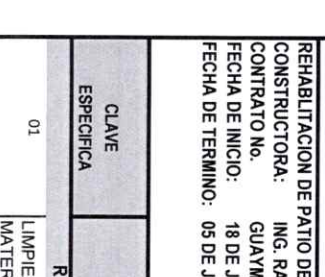
**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**FINIQUITO**

REHABILITACION DE PATIO DE PALACIO MUNICIPAL, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONSTRUCTORA: ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ  
CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SE-11  
FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DEL 2024  
FECHA DE TERMINO: 05 DE JULIO DEL 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA  
GUAYMAS, SONORA,  
09 DE JUNIO DEL 2024  
11:00 HORAS  
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS  
No. FIANZA ANTICIPO  
No. FIANZA CUMPLIMIENTO

24A37389

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE
			CONTRATADO	FINIQUITO		CANTIDAD	IMPORTE		
01	LIMPIEZA Y LAVADO A PRESION DE ELEMENTOS A PINTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	230.80		\$ 32.06	176.02	0.00	176.02	\$ 5,643.20
02	RESANE DE FISURAS, GRIETAS Y DETALLES EN ELEMENTOS A PINTAR, CON APLANADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00		\$ 6,624.58	1.00	0.00	1.00	\$ 6,624.58
03	APLICACION DE PINTURA VINILACRILICA MARCA BERLINT SEGU MUESTRA, SOBRE AREA DE FALDON DE PASILLO DE 2DA PLANTA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	109.20		\$ 114.07	48.42	0.00	48.42	\$ 5,523.27
04	APLICACION DE PINTURA VINILACRILICA MARCA BERLINT SEGU MUESTRA, SOBRE AREA DE COLUMNAS DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	121.60		\$ 114.07	127.60	0.00	127.60	\$ 14,555.33
05	APLICACION DE PINTURA EN ESCALERA DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00		\$ 5,896.49	1.00	0.00	1.00	\$ 5,896.49
06	APLICACION DE PINTURA EN PUERTA DE MADERA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00		\$ 7,833.99	1.00	0.00	1.00	\$ 7,833.99
07	RESANE DE GRIETAS Y FISURAS EN BANQUETAS PERIMETRALES EN PATIO CENTRAL Y PASILLO FRONTAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00		\$ 8,046.61	1.00	0.00	1.00	\$ 8,046.61
08	LIMPIEZA Y LAVADO A PRESION DE PATIO CENTRAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	146.70		\$ 32.06	157.38	0.00	157.38	\$ 5,045.60
09	DETALLADO DE BOQUILLA DE PIEDRA EN PATIO CENTRAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00		\$ 4,635.22	1.00	0.00	1.00	\$ 4,635.22
10	APLICACION DE INTENSIFICADOR, DE TONO DE PIEDRA DE PATIO CENTRAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	164.70		\$ 129.97	149.40	0.00	149.40	\$ 19,417.52
PPF-01	APLICACION DE PINTURA ESMALTE SEGUN MUESTRA, EN PLAFON DE PASILLO Y TRABE PERIMETRAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	60.1205		\$ 160.51	60.1280	0.00	60.1280	\$ 9,651.14
<b>ACOMULADO TI \$</b>									<b>92,872.95</b>
DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO LAS PARTES MANIFIESTA: DE QUE NO EXISTE OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS FACILITABLES CORRESPONDIENTES									
<b>CONTRATISTA</b>			<b>SUPERVISOR</b>			<b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA</b>			
ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ 			ING. CORNELIO LANGURE DUARTE 			ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA 			
IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A DE C.V. ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ									
